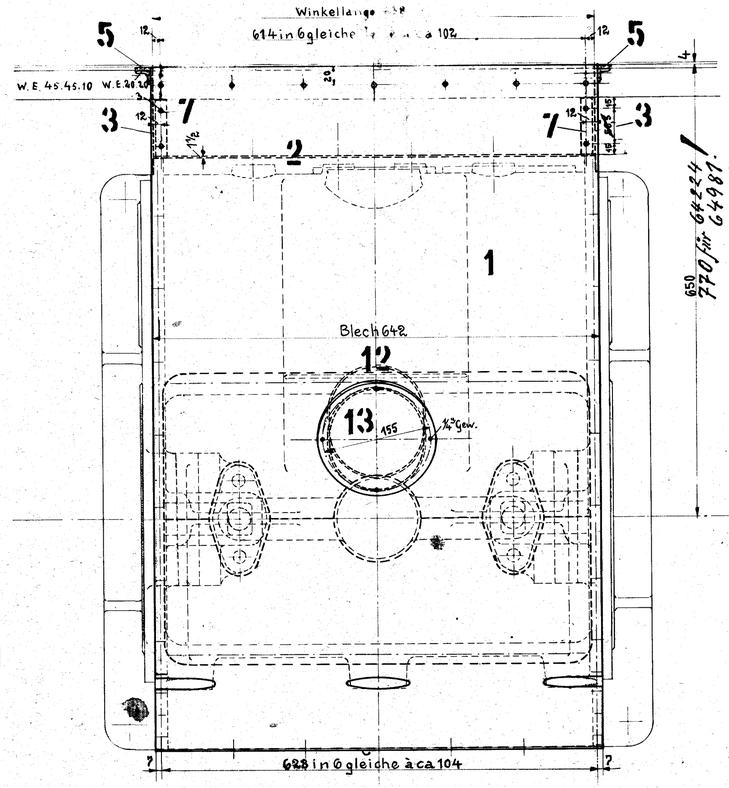

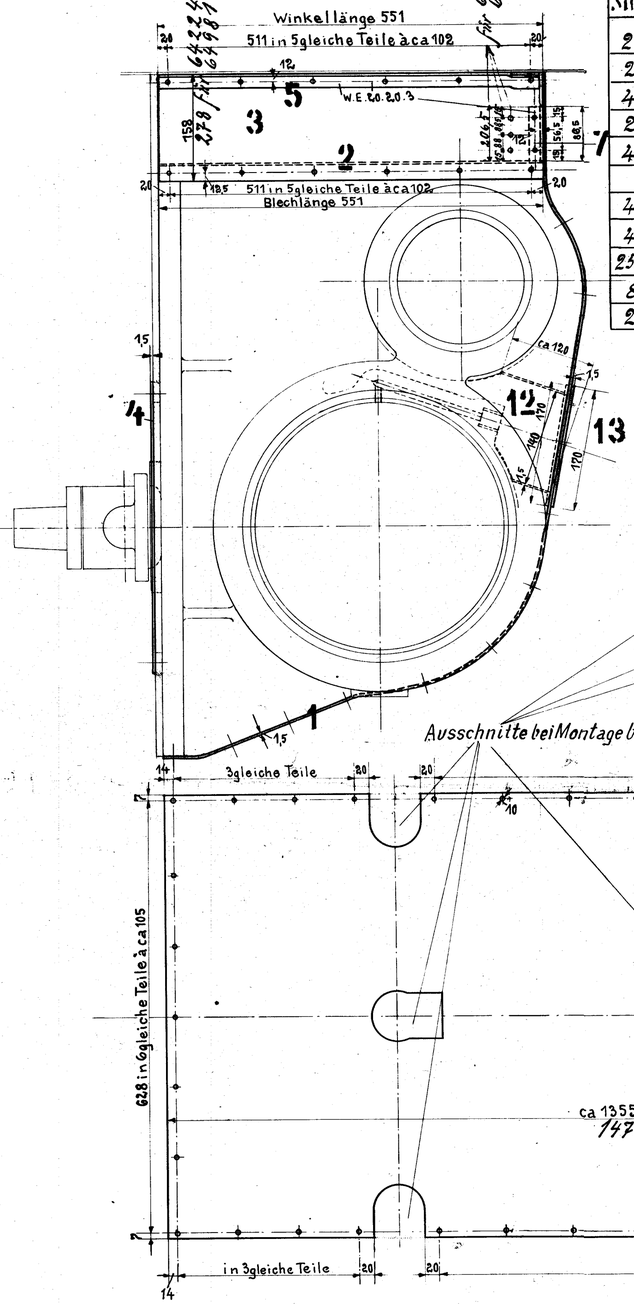

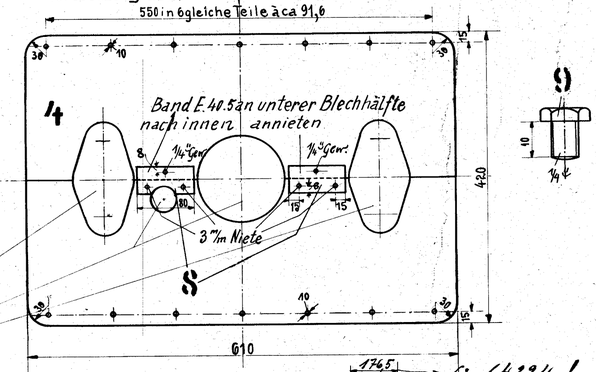

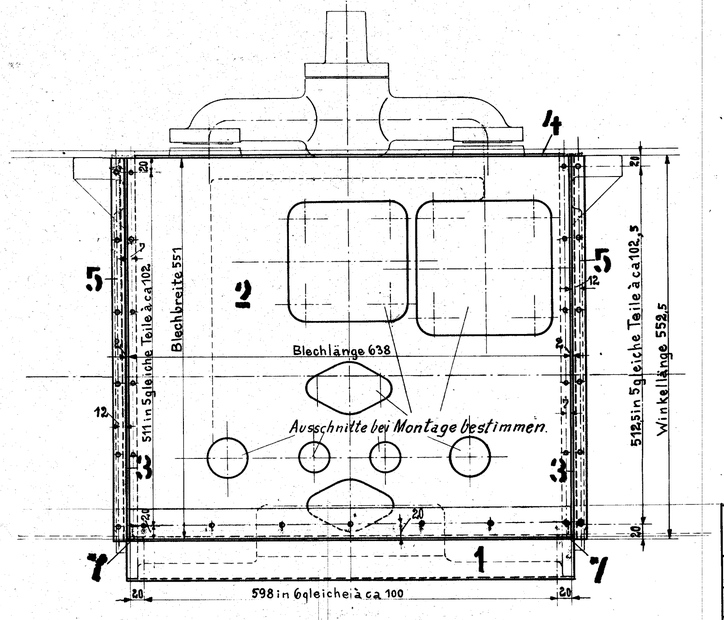

Stückliste

Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	Gerechn. Gew. p. Stck
2	1	Fl.E.I	Bleche 1,5 st. 642. ca 1355		
2	2	" " "	" " " 551. 638		
4	3	" " "	Bleche 2 · 158. 551		
2	4	" " "	" 1,5 · 610. 420 geteilt.		
4	5	" " "	Winkeleisen	W.E. 20.20.3. 551 lg.	
4	7	" " "	" "	" " 20.20.3. 86,5 "	
4	8	" " "	Bleche	Band E. 40.5 80 ·	
258	9	" " "	Kopfschrauben 1/4", 10 lg	v. L.	
8	10	SE.	Niete	3 m/m st. v. L.	
2	11	Asbest	Matratzen	1450. 60. 20 aus w. bestellt.	

Linschlagige Zeichnungen

Benennung	Auftr. 63387	Auftr.	Auftr.
Cylinder	60 622		
Rahmen			
Druckausgleich vorrichtg	60 761		

Profileisen.

Lfd. Mtr.	Profil	Bemerkg.
ca 3,95	WSE 20.20.3	
ca 0,16	B.E. 40.5	

Schlüsseltabelle.

Stück	Nummer
1	1/4"

2	12	K.	Kappen	140 ϕ, ca 120 lg. anpassen	
2	13	F III	Bleche	170 ϕ, 1½ m/m st.	

A. BORSIG BERLIN

Gepr. Gen. Gez. 2/11/10 Gantz Gep. Berechnungs-Karte No.

Zylinderverkleidung.

Maßstab 1:5, 1:1

Datum Auftrag Besteller

Auftrag 63387 Kammel Aachen 7 Stck 3 mal } Zeichnung
64224 Ziegelsdorf 760 Stck 3 mal } Schablone
64981 Bremerhaven 760 Stck 3 mal } Fabrikat

Besteller Loc. № Auftrag

Datum Auftrag

Datum Aufgabe
